EWN
Entsorgungswerk für Nuklearanlagen

Prüfprotokoll für fahrbare Arbeitsbühnen/fahrbare Gerüste

IH-Nummer: | | | | | | | | | |

Standort/Baustelle: _____

Gerüstnutzende (OE): _____

Gerüststeller/in (Firma/OE): _____

☐ **Fahrbare Arbeitsbühne** (nach DIN EN 1004) **Typ:** _____

☐ **Fahrbares Gerüst** (nach DIN 4420-3) **Typ:** _____

Gerüstgruppe/Lastklasse

☐ **2** (1,5 kN/m²) ☐ **3** (2,0 kN/m²) ☐ **4** (3,0 kN/m²) ☐ _____ (kN/m²)

Höchstzulässige Standhöhe gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung

außerhalb von Gebäuden

☐ _____ m

innerhalb von Gebäuden

☐ _____ m

Nutzungsbeschränkungen: _____

Gerüst arbeitstäglich und nach jedem Ortswechsel auf Betriebssicherheit kontrollieren!

Warnhinweise:

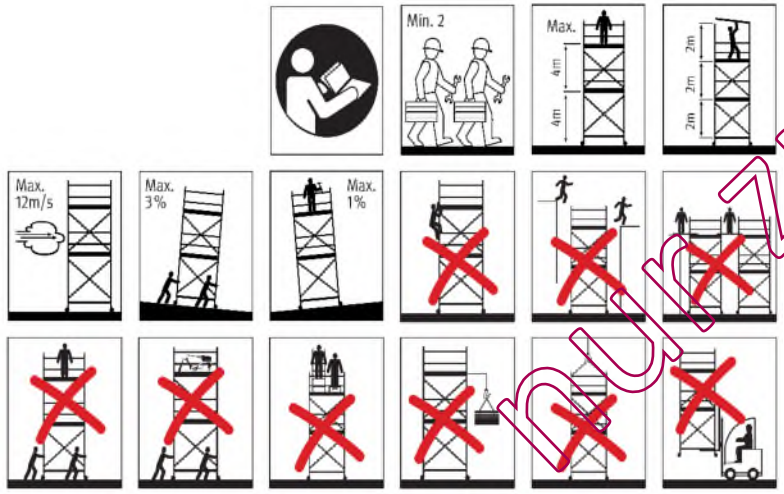

Durch zur Prüfung befähigte Person des/der Gerüststellers/in geprüft:

Datum: _____

Tel.: _____

Name: _____

Unterschrift: _____

Qualifizierte Person des/der Gerüstnutzers/in:

Datum: _____

Tel.: _____

Name: _____

Unterschrift: _____

FMBL 0506 P1K, 30.03.2021

Checkliste

Hinweis: Die Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) muss zwingend für die Gerüstprüfung vor Ort vorhanden sein!

Prüfumfang		in Ordnung ja	in Ordnung nein	nicht zutreffend
Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV)	war für die Gerüstprüfung vor Ort vorhanden	☐	☐	☐
Gerüst	Verwendungszweck - geeignet	☐	☐	☐
Gerüstbauteile	augenscheinlich unbeschädigt	☐	☐	☐
Fahrwerk	Feststellbremse an allen 4 Fahrrollen	☐	☐	☐
	Rahmenfahrbalken entsprechend Standhöhe (= oberste Belagfläche) nach AuV	☐	☐	☐
	Seitenschutzteile zur Aussteifung (entsprechend Standhöhe nach AuV)	☐	☐	☐
	Ballastierung (entsprechend Standhöhe nach AuV)	☐	☐	☐
	Ausleger zur Verbreiterung der Standfläche (entsprechend Standfläche nach AuV)	☐	☐	☐
	Belagteile ohne Durchstieg eingebaut (entsprechend Standhöhe nach AuV)	☐	☐	☐
	Diagonalen eingebaut	☐	☐	☐
Zwischenlage	Belagteil mit Durchstieg eingebaut	☐	☐	☐
	Belagfläche vollständig mit Belagteilen ausgelegt	☐	☐	☐
	Seitenschutz (min. Geländer- und Zwischenholm)	☐	☐	☐
	Diagonalen eingebaut	☐	☐	☐
	Aufstieg innerhalb des Gerüstes	☐	☐	☐
	☐ Typ A Treppe ☐ Typ B Stufenleiter ☐ Typ C Schrägleiter ☐ Typ D vertikale Leiter	☐	☐	☐
oberste Belagfläche (Standhöhe)	Belagteil mit Durchstieg eingebaut	☐	☐	☐
	Belagfläche vollständig mit Belagteilen ausgelegt	☐	☐	☐
	Seitenschutz dreiteilig, Geländerholm 1 m über Gerüstbelag	☐	☐	☐
Sonderaufbauten	Übereinstimmung mit AuV/Typenstatik	☐	☐	☐

Bemerkungen/Hinweise:

Kennzeichnung am Gerüst nur anbringen, wenn keine Mängel vorhanden sind!

Verteiler: weiß=Baustelle, gelb=Auftraggeber, rot=Gerüststeller

nur zur Ansicht
